

São Paulo, 21 de dezembro de 2017.

Ref.: Ofício nº 1139/2017/GP

Senhor Presidente,

Diante das atribuições a mim conferidas e em atenção ao ofício acima referido, no qual encaminha a Moção nº 164/2017, de repúdio à Concessionária Rodovias do Tietê S/A, em razão dos péssimos serviços prestados às rodovias que circundam Botucatu, além dos recentes problemas criados pela mesma, em obras desenvolvidas na busca de melhorias para a população, encaminho-lhe cópias às fls. 10 a 42 das informações prestadas pela Diretoria de Investimentos sobre o assunto.

Aproveito o ensejo para cumprimentá-lo, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Jorge Luiz Pereira
Chefe de Gabinete

Fernanda V. Torrano Alexiou
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor
Izaías Branco da Silva Colino
Presidente da Câmara Municipal de Botucatu
Praça Comendador Emílio Peduti, 112 - Centro
18600-410 - Botucatu - SP



th/MIAOF

CÓPIA

369952

Folhas

Nome/Rubrica


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Gastão Dal Farra - SPA241/300


Novembro

22/11/2017

Situação do pavimento km 0 Norte/Sul

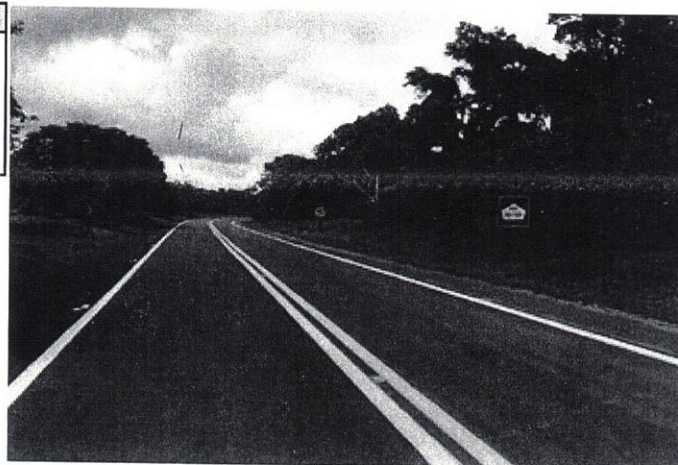

Situação do pavimento km 2 Norte/Sul

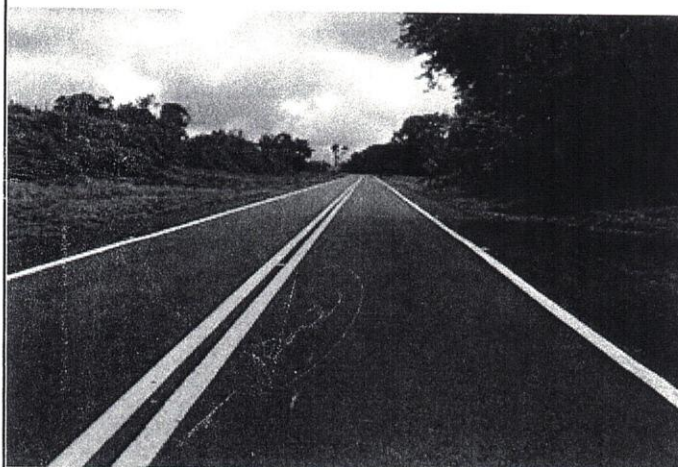

Situação do pavimento km 2,5 Norte/Sul



CÓPIA

PROTOCOLADO

369952

Folhas Nome/Rubrica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Gastão Dal Farra - SPA241/300

Novembro

22/11/2017

Situação do pavimento km 3 Norte/Sul



Situação do pavimento km 4 Norte/Sul



Situação do pavimento km 6 Norte/Sul



CÓPIA

PROTOCOLADO

369952

Folhas Nome/Rubrica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Gastão Dal Farra - SPA241/300

Novembro

22/11/2017

Situação do pavimento km 7 Norte/Sul



Situação do pavimento km 8,5 Norte/Sul



Situação do pavimento km 9 Norte/Sul



CÓPIA

369952

Folhas

13

Nome/Rubrica


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Gastão Dal Farra - SPA241/300


Novembro

22/11/2017

Situação do pavimento km 9,4 Norte/Sul

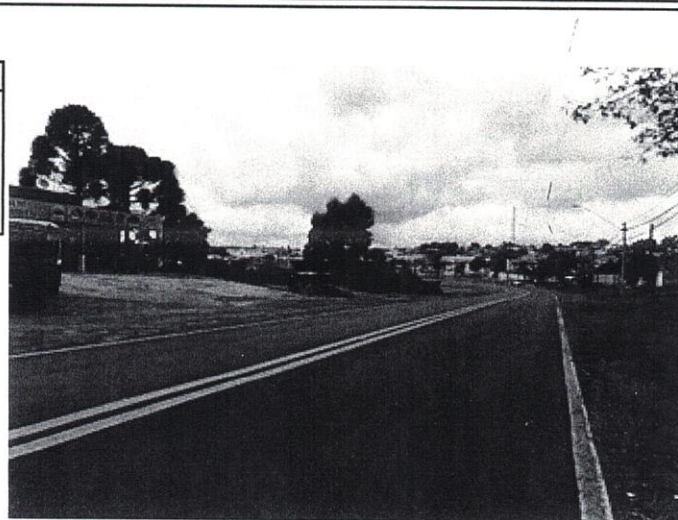

Situação do pavimento km 9,6 Norte/Sul

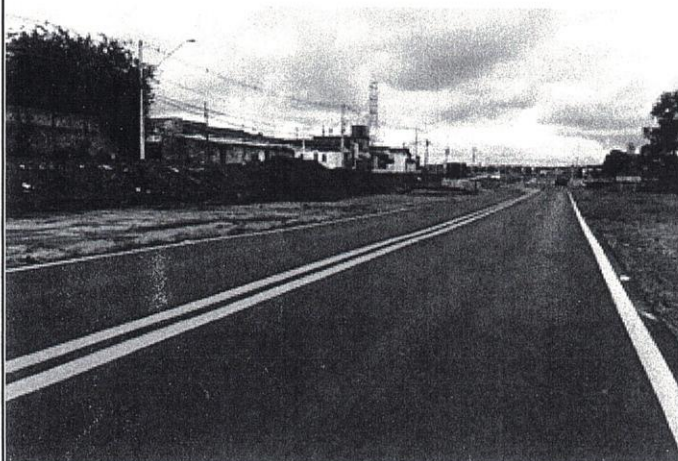

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Antônio Butignoli - SPA254/300 - Trevo Concessao


Novembro

23/11/2017


Vista geral Norte/Sul Trevo km 253,600



Vista Pista Norte Trevo km 253,600

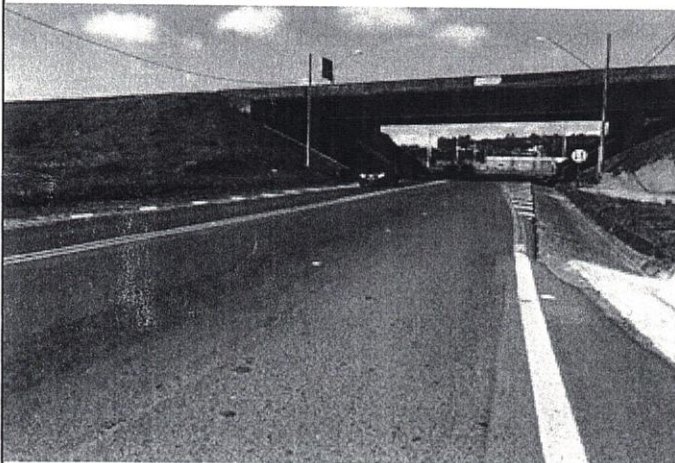

Vista Pista Norte Trevo km 253,600

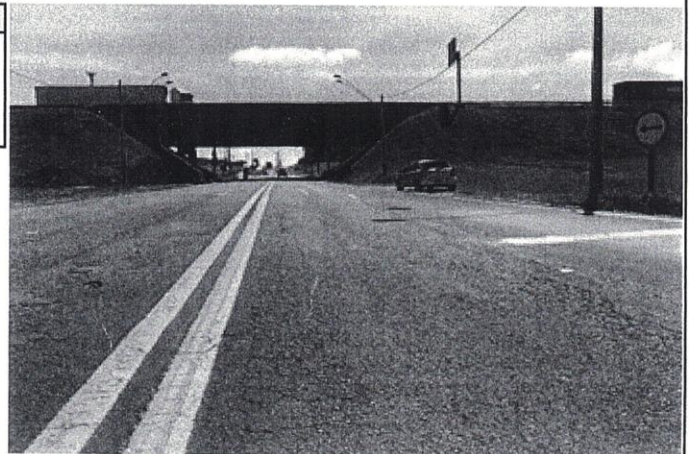


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Antônio Butignoli - SPA254/300 - Trevo Concessao

Novembro

23/11/2017


Vista Pista Sul Trevo km 253,600

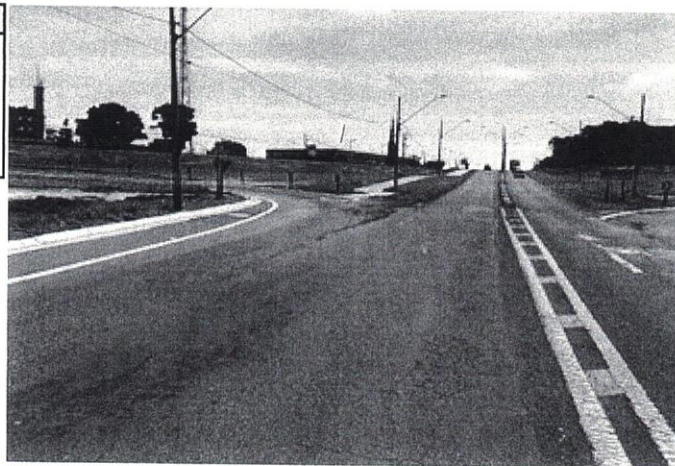

Vista Pista Sul Trevo km 253,600



Vista Pista Norte Trevo km 253,600

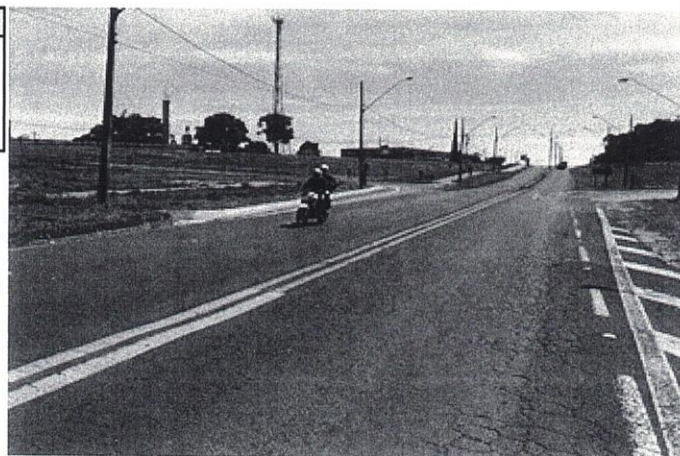


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

João Hipólito Martins - SP209

Novembro

23/11/2017

Vista geral inicio do trecho Pista Sul

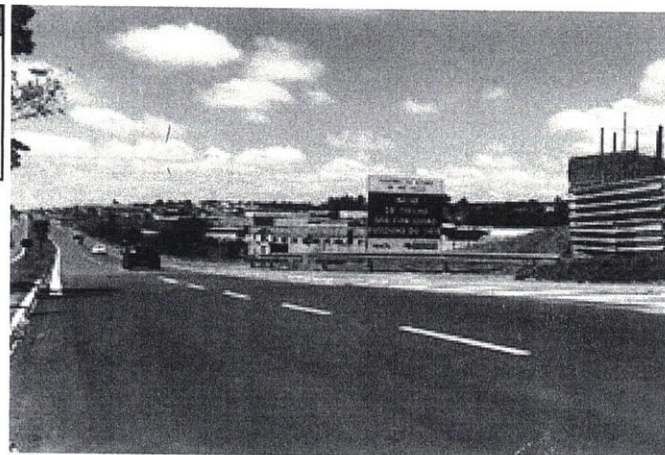

Vista inicio do trecho Pista Sul



Vista geral KM 18




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

João Hipólito Martins - SP209


Novembro

23/11/2017


Vista Pista Sul KM 11

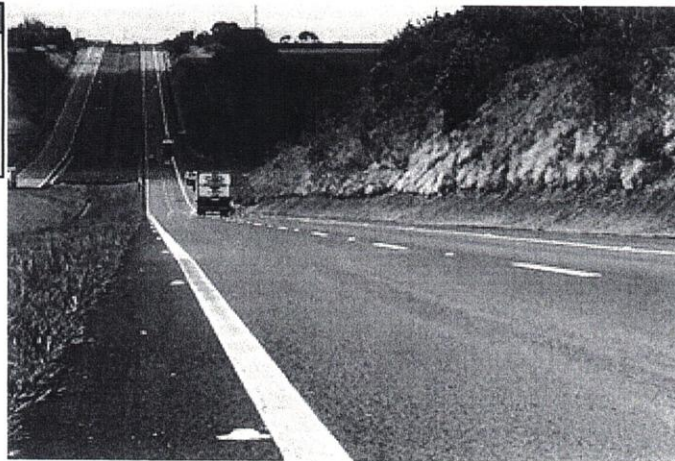

Vista Pista Norte KM 5

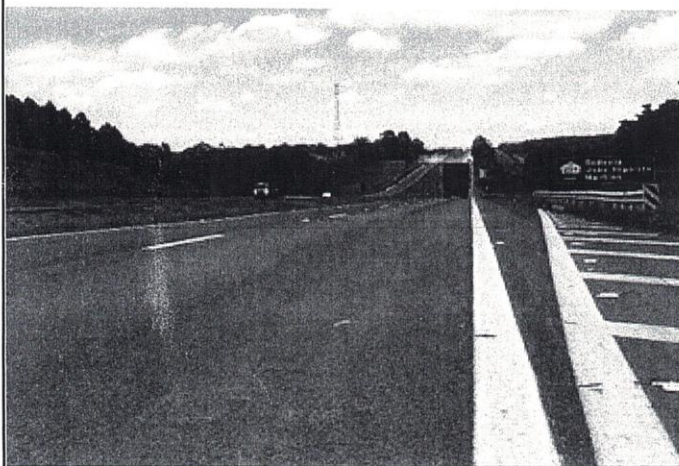

Vista Pista Norte KM 14

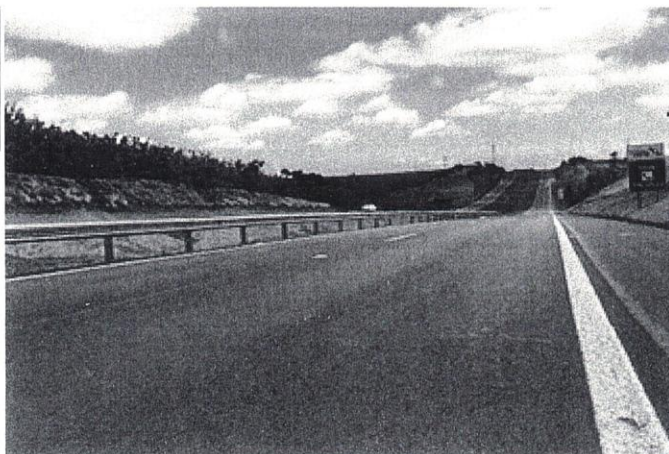


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

João Hipólito Martins - SP209

Novembro

23/11/2017


Vista Pista Norte KM 10,800

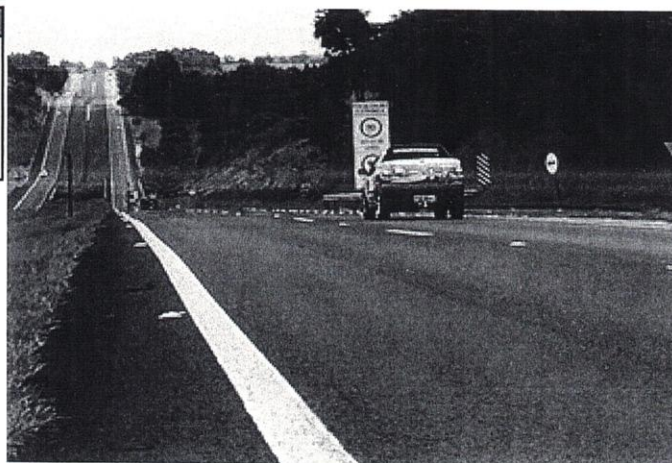

Vista Pista Norte KM 2



Vista Pista Norte KM 15

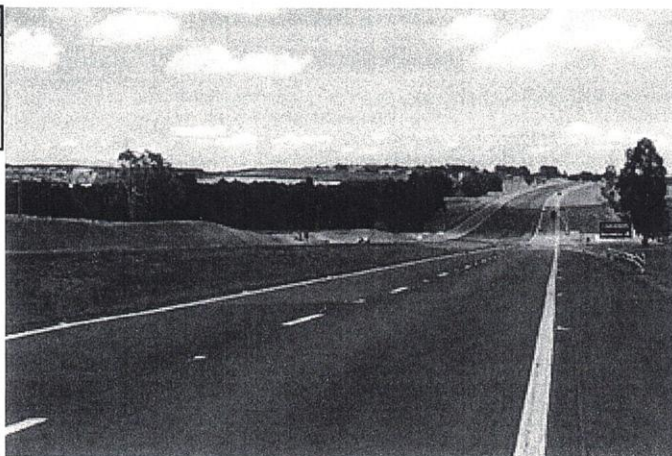

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Domingos Sartori - SPA251/300


Novembro

23/11/2017

Vista Pista Norte km 2



Vista Pista Sul Km 1


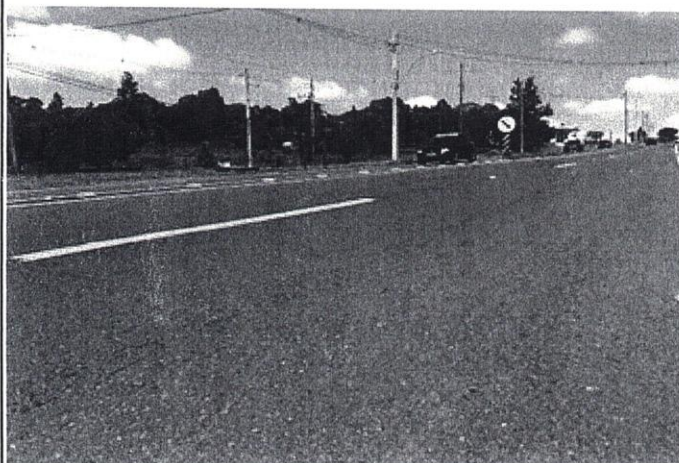


Vista Pista Norte km 3



COPIA

PROTOCOLADO	
369952	
Folhas	Nome/Rubrica
22	

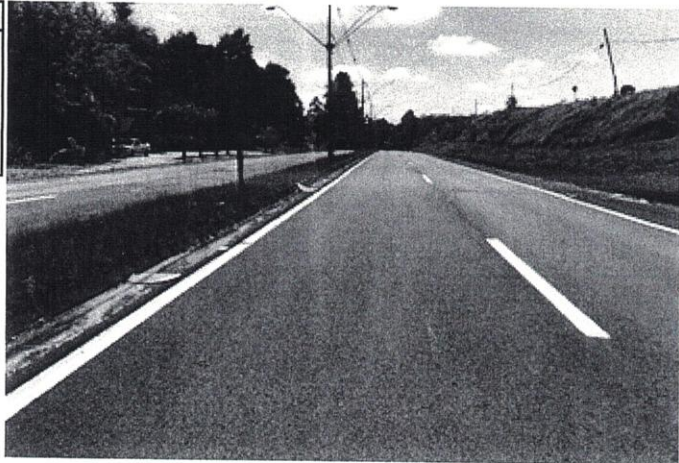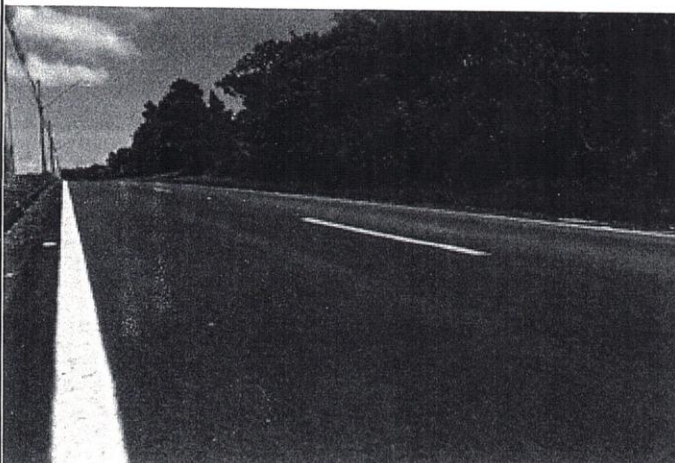RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Domingos Sartori - SPA251/300	
Novembro	23/11/2017
Vista Pista Norte km 4	
	Vista Pista Sul km 3
Vista Pista Norte km 2,5	

CÓPIA

PROTOCOLADO

369952

Folhas

Nome/Rubrica


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Domingos Sartori - SPA251/300


Novembro

23/11/2017

Vista Pista Norte km 2,4

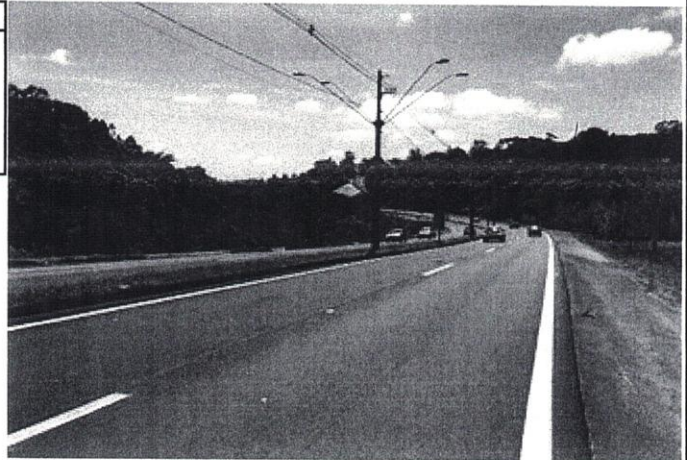

Vista Pista Sul km 1

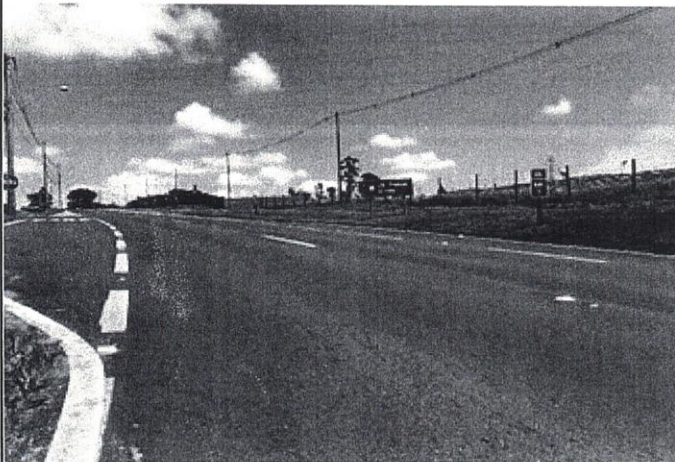

CÓPIA

PROTOCOLADO

369952

Folhas

Nome/Rubrica

DUPLICAÇÃO DA ROD. SPA 241/300 (GASTÃO DAL FARRA) REALIZADO PELA PREFEITURA DE BOTUCATU

Mapa de Localização

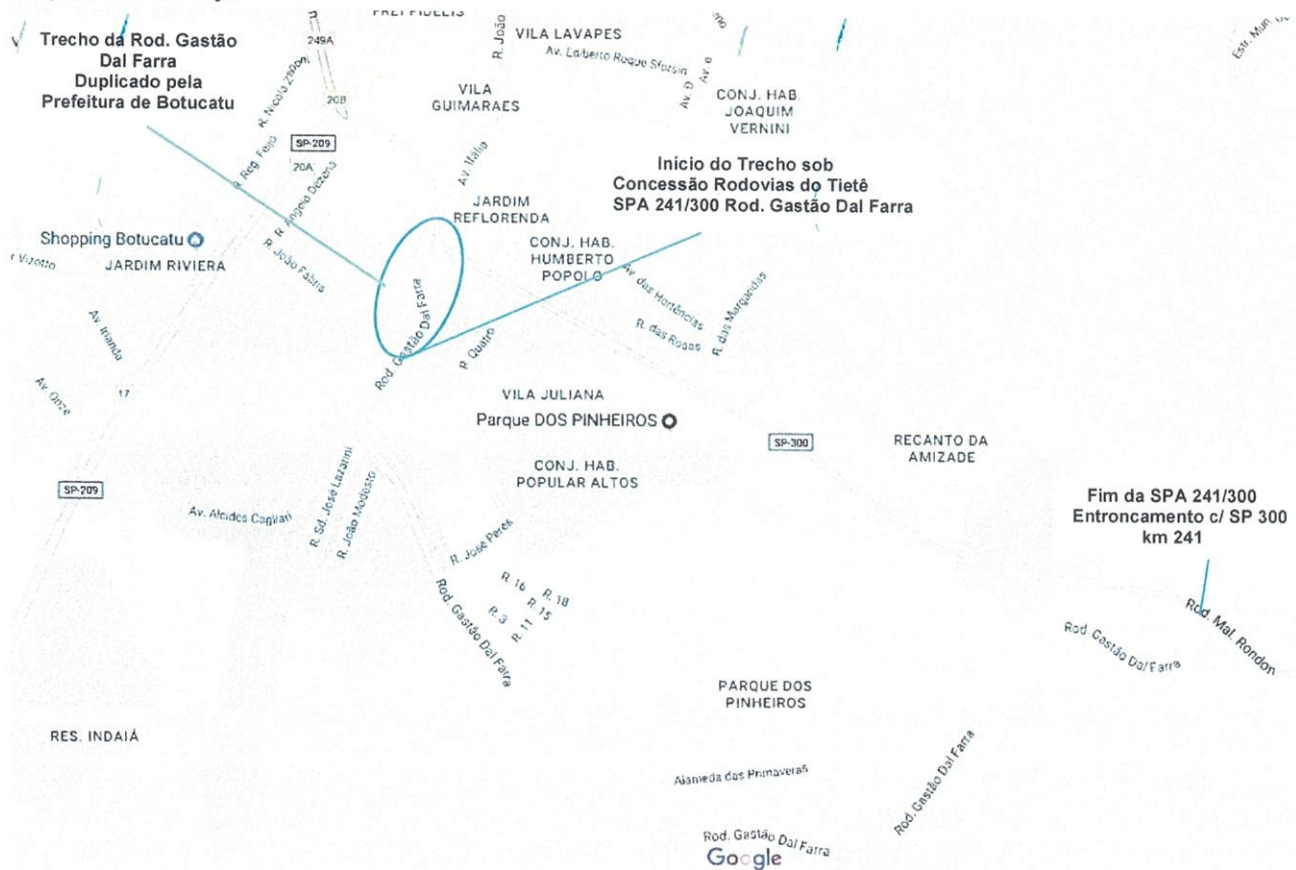


Foto 1 - Placa Institucional da Obra



Foto 2 - Início do trecho duplicado (SPA-241 - Rod. Gastão Dal Farra).

CÓPIA

PROTOCOLADO

369952

Folhas

Nome/Rubrica



Foto 3 – Trecho duplicado pela Prefeitura de Botucatu. Vista sentido Bairro Pq. Dos Pinheiros.

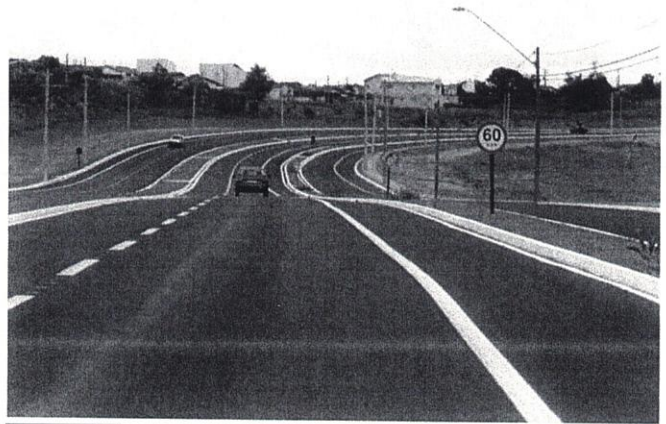


Foto 4 – Vista do trecho duplicado.



Foto 5 – Obra de Duplicação realizado pela Prefeitura de Botucatu.



Foto 6 – Vista do final do trecho duplicado (Extensão 870 m).

CONFLITO COM O TRECHO SOB CONCESSÃO RODOVIAS DO TIETÊ



Foto 7 – Início do trecho sob Concessão Rodovias do Tietê. Obra embargada pela Tietê.

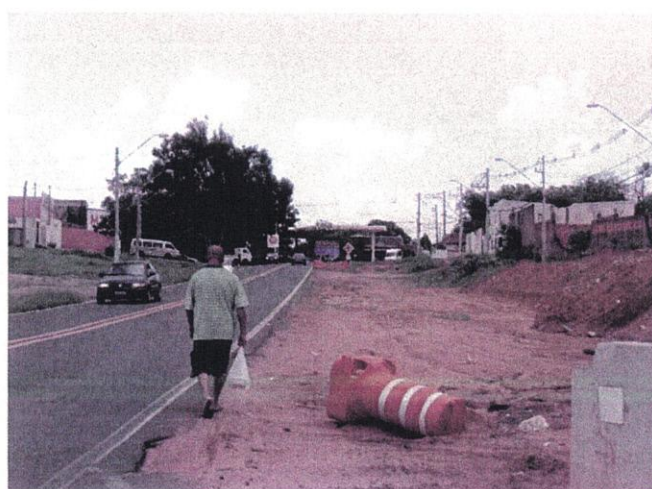


Foto 8 – Vista da Obra de duplicação paralisada.

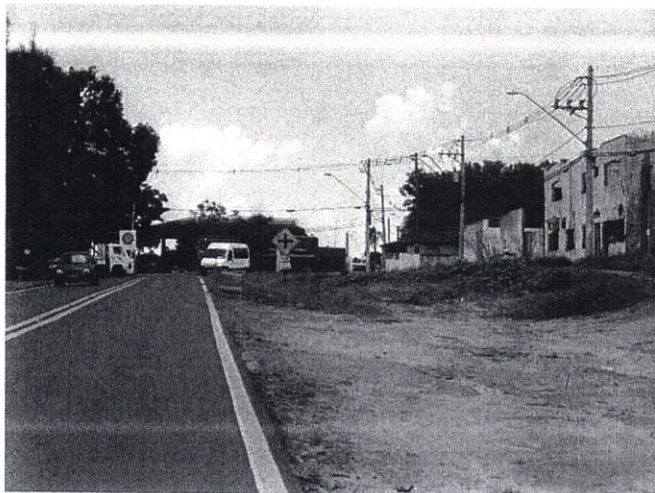


Foto 9 – Obra de duplicação paralisada. Restando 250 m até entrada da Av. Alcides Cagliari.

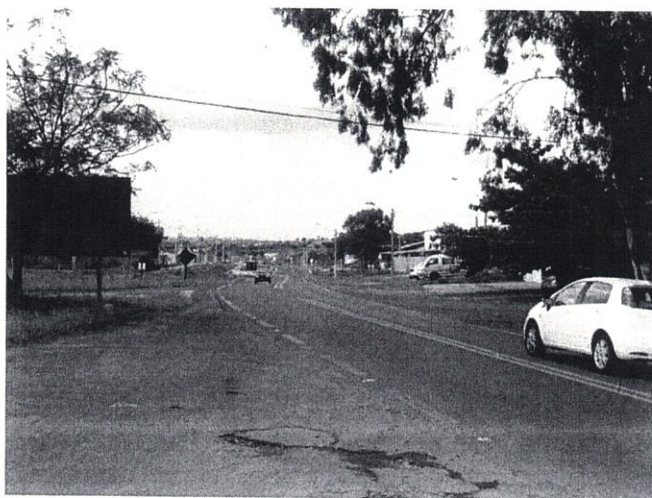


Foto 10 – Obra de duplicação paralisada. Vista sentido SP 300.



Foto 11 – Obra de duplicação paralisada. Vista sentido SP 300.

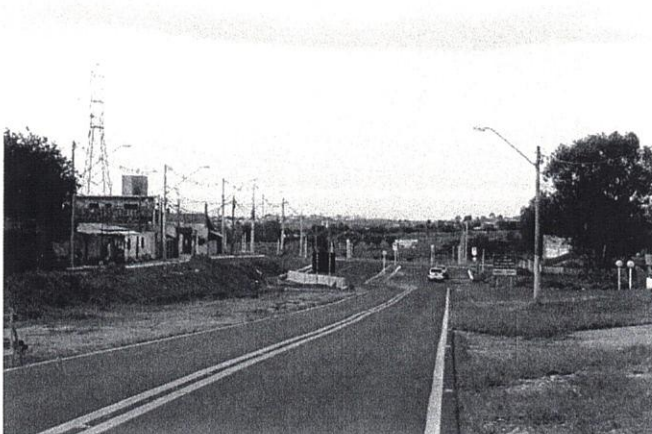


Foto 10 – Vista da Obra embargada pela Rodovias do Tietê. Trecho sob Concessão.



Foto 11 – Vista da Obra embargada pela Rodovias do Tietê. Trecho sob Concessão.



Foto 12 – Limite do trecho Rodovias do Tietê e Prefeitura de Botucatu. Vista sentido SP 300

IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA REALIZADO PELA PREFEITURA DE BOTUCATU (LIGAÇÃO ENTRE BAIRROS) – TRAVESSIA DO DISPOSITIVO KM 253+700 / SP 300

A Concessionária Rodovias do Tietê interrompeu os serviços de implantação de Ciclovia no Dispositivo (Trecho sob Concessão) alegando que possa haver risco para o ciclista no momento da travessia do dispositivo.

PROTOCOLADO	
369952	
Folhas	Nome/Rubrica
26	

Situação Atual (23-11-2017).

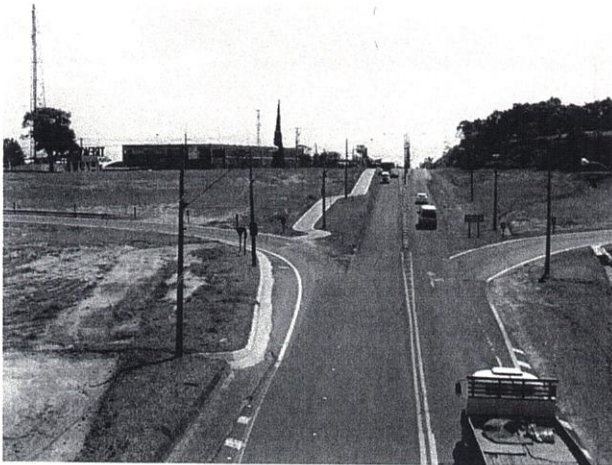


Foto 1 – Vista da Ciclovia executada pela Prefeitura de Botucatu. Obra embargada pela Concessionária Rodovias do Tietê.



Foto 2 – Vista do trajeto onde seria executado a Ciclovia. Serviços no canteiro do dispositivo km 253+700 (Botucatu) interrompidos.



Foto 3 – Vista do trecho de Ciclovia executada no canteiro do dispositivo (lado Oeste). Obra interrompida.



Foto 4 – Vista do trecho de Ciclovia executada no canteiro do dispositivo (lado Oeste). Obra interrompida.

CÓPIA

PROTOCOLADO

69952

Selhas Nome/Rubrica



Foto 5 – Travessia da pista (alça de retorno, Oeste) interrompida pela Concessionária Rodovias do Tietê.



Foto 6 – Vista do trajeto onde seria executado a Ciclovía (Passagem sob o viaduto). Obra paralisada.

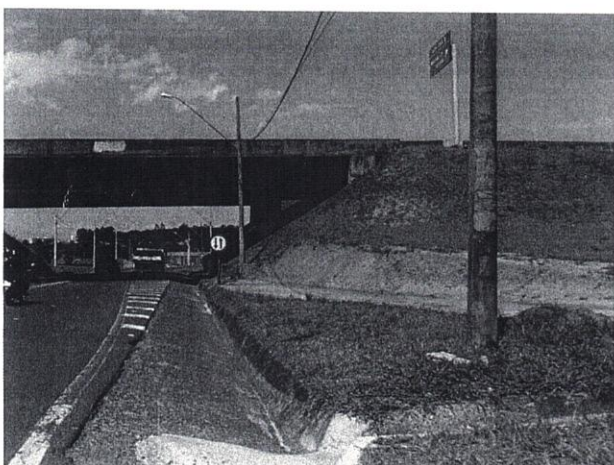


Foto 7 – Vista do trajeto onde seria executado a Ciclovía (Passagem sob o viaduto). Serviços paralisados.

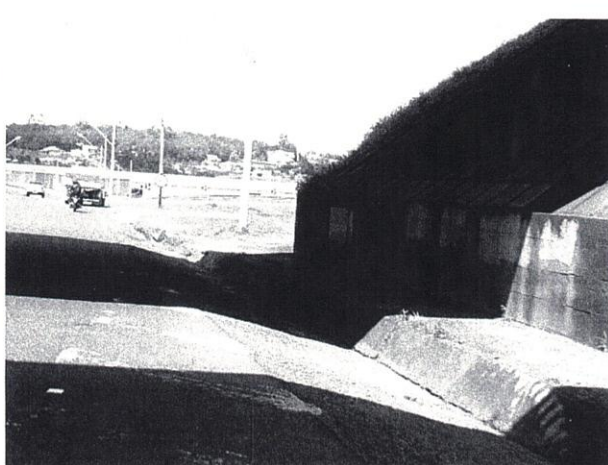


Foto 8 - Vista do trajeto onde seria executado a Ciclovía (Passagem sob o viaduto). Serviços paralisados.

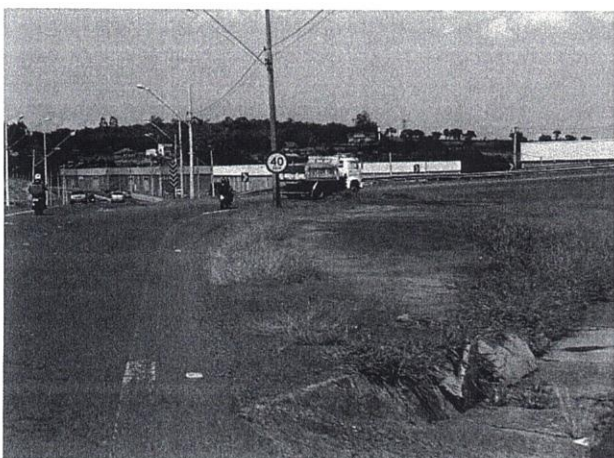


Foto 9 – Vista do trajeto onde seria executado a Ciclovía. Serviços no canteiro do dispositivo km 253+700 (Botucatu) interrompidos.

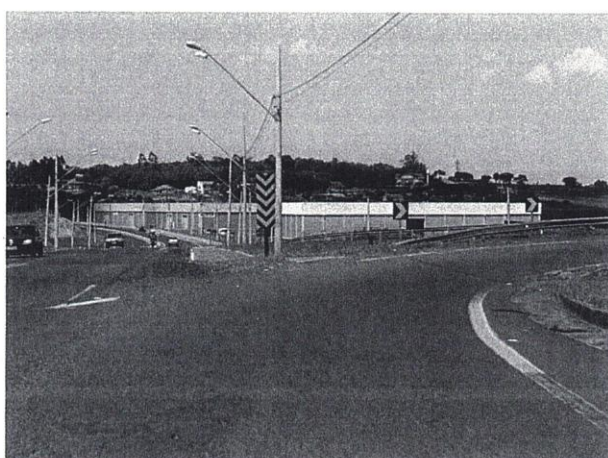


Foto 10 – Travessia da pista (alça de retorno, Leste) interrompida pela Concessionária Rodovias do Tietê.



Foto 11 – Vista do trecho de Ciclovía executada no canteiro do dispositivo (lado Leste). Obra interrompida.



Foto 12 – Vista do trecho de Ciclovía executada no canteiro do dispositivo (lado Leste). Obra interrompida.

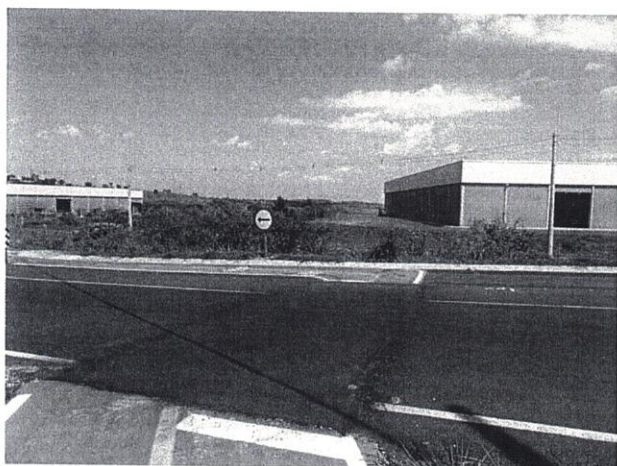


Foto 13 – Travessia da pista (alça de entrada para bairro, Leste) interrompida pela Concessionária Rodovias do Tietê.

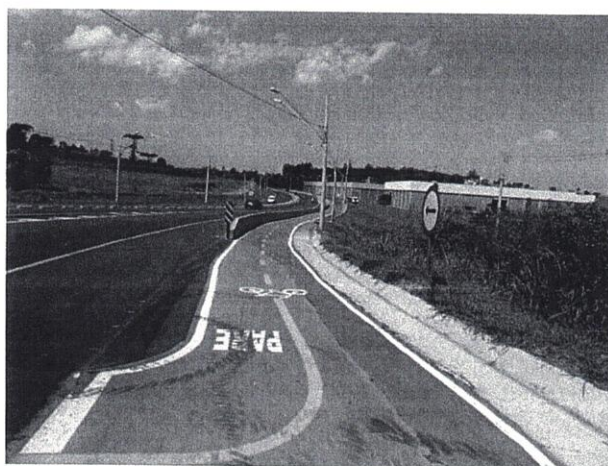


Foto 14 – Vista da continuação da Ciclovía executada pela Prefeitura de Botucatu (sentido Rubião Jr).

CÓPIA

PROTOCOLADO

369952

Folhas 29 Nome/Rubrica

100 m

Implantação de Ciclovia realizado pela Prefeitura de Botucatu (Ligação entre Bairros)

Situação Atual (01-09-2017)

Botucatu - SP
Dispositivo km 253+700

Trçado empedrado para Concessionária
Rodovias do Tietê






BAURU
SP 300

SP 300

TIETÊ

Google Earth

SP 01/07/2017 09:55:17

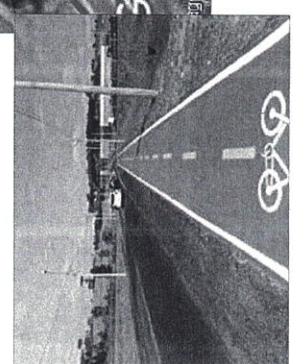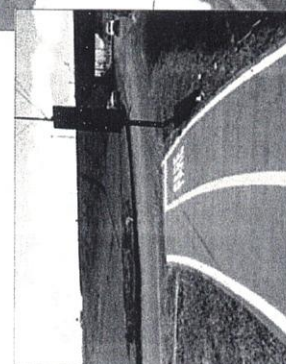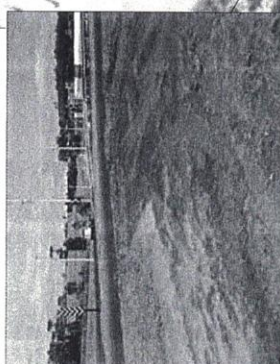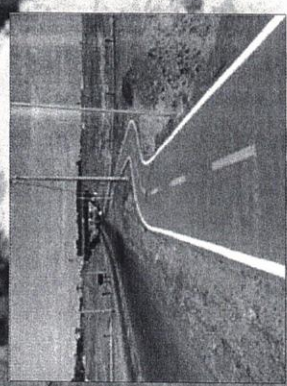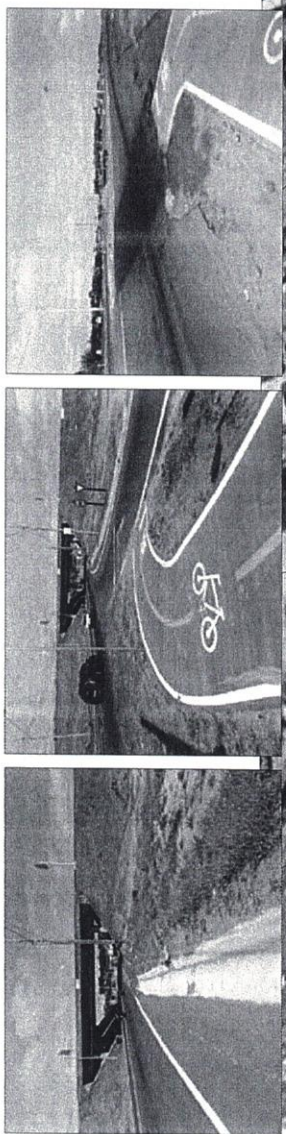

CÓPIA

PROTOCOLADO	
369952	
Folhas 30	Nome/Rubrica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: 15.01.04.06 - Recapeamento - Vicinal BTC 353 - Botucatu (Extensão 7,406 km)

Novembro/2017

07/11/2017

L21_15010406_2017-10-17_Foto (1)

Placa Institucional da obra.




L21_15010406_2017-10-31_Foto (2)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 4+000 ao km 4+500 em execução.



L21_15010406_2017-10-31_Foto (3)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 4+000 ao km 4+500 em execução.

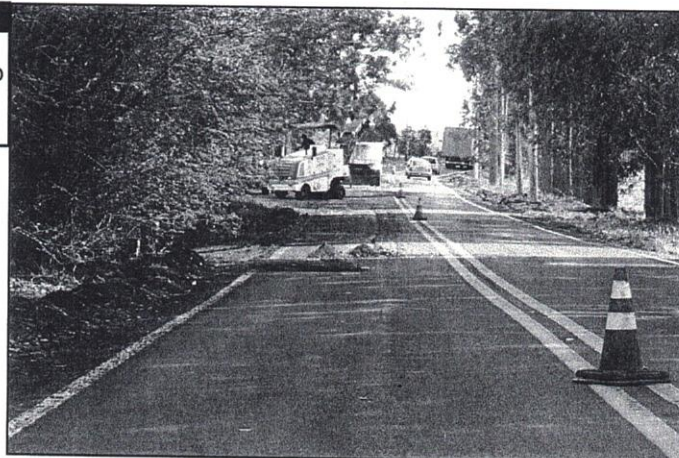

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: 15.01.04.06 - Recapeamento - Vicinal BTC 353 - Botucatu (Extensão 7,406 km)

Novembro/2017

07/11/2017

L21_15010406_2017-10-31_Foto (4)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 4+000 ao km 4+500 em execução.




L21_15010406_2017-10-31_Foto (5)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 4+000 ao km 4+500 em execução.



L21_15010406_2017-10-31_Foto (6)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 3+000 ao km 4+000, concluído.

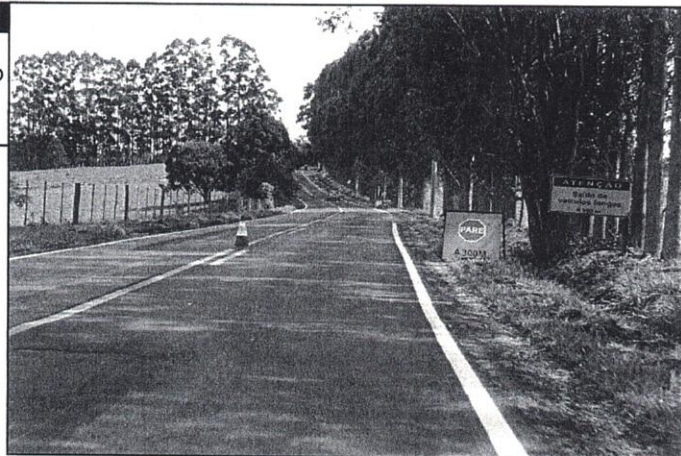

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Obra: 15.01.04.06 - Recapeamento - Vicinal BTC 353 - Botucatu (Extensão 7,406 km)

Novembro/2017

07/11/2017

L21_15010406_2017-10-31_Foto (7)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 3+000 ao km 4+000, concluído.

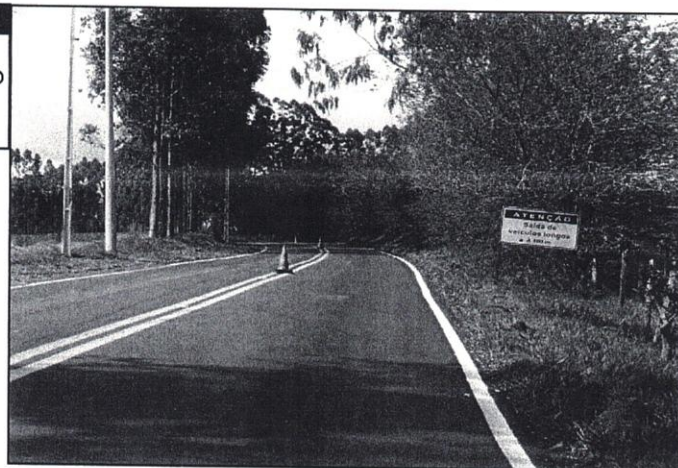


L21_15010406_2017-10-31_Foto (8)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 3+000 ao km 4+000, concluído.



L21_15010406_2017-10-31_Foto (9)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 2+000 ao km 3+000, concluído.

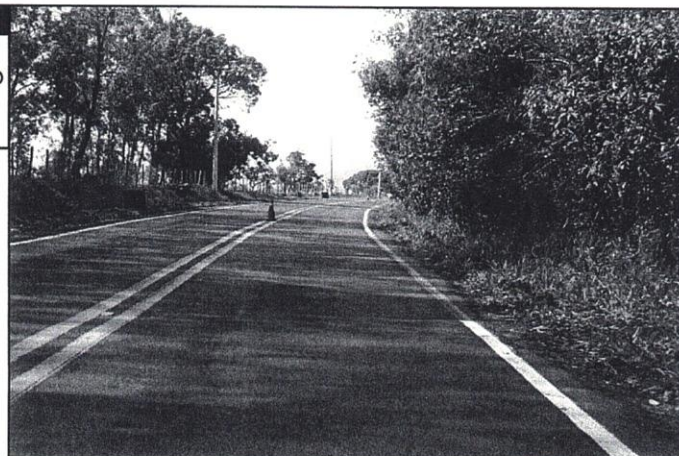

CÓPIA

PROTOCOLADO

369952

Folhas

Nome/Rubrica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Obra: 15.01.04.06 - Recapeamento - Vicinal BTC 353 - Botucatu (Extensão 7,406 km)

Novembro/2017

07/11/2017


L21_15010406_2017-10-31_Foto (10)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 2+000 ao km 3+000, concluído.

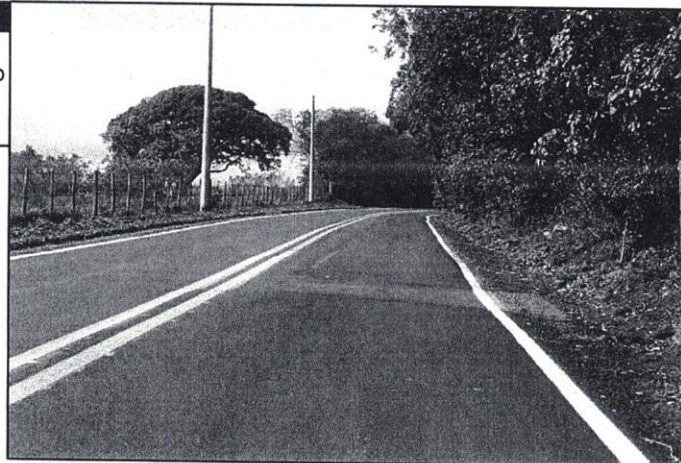


L21_15010406_2017-10-31_Foto (11)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 1+000 ao km 2+000, concluído.

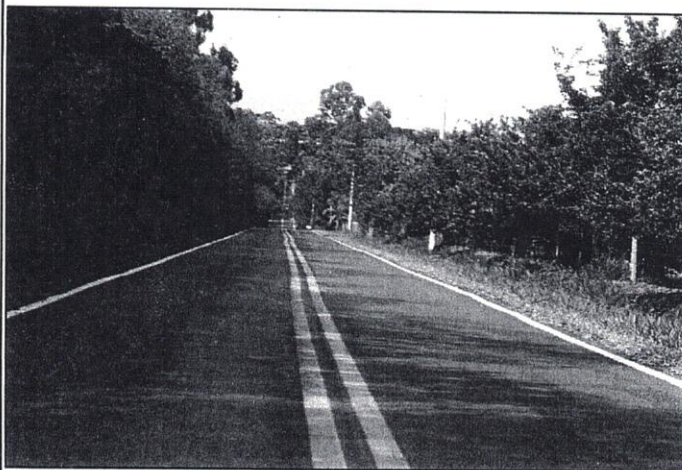

L21_15010406_2017-10-31_Foto (12)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 0+000 ao km 1+000, concluído.

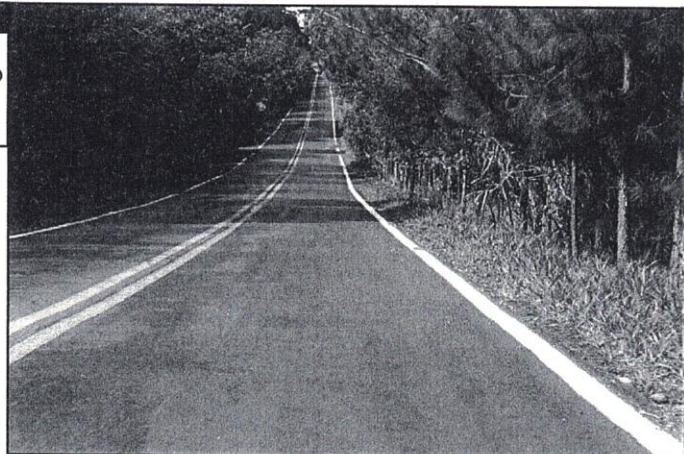

CÓPIA

PROTOCOLADO

369952

Folhas

Nome/Rubrica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Obra: 15.01.04.06 - Recapeamento - Vicinal BTC 353 - Botucatu (Extensão 7,406 km)

Novembro/2017

07/11/2017


L21_15010406_2017-11-07_Foto (13)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 4+500 ao km 7+406 em execução.

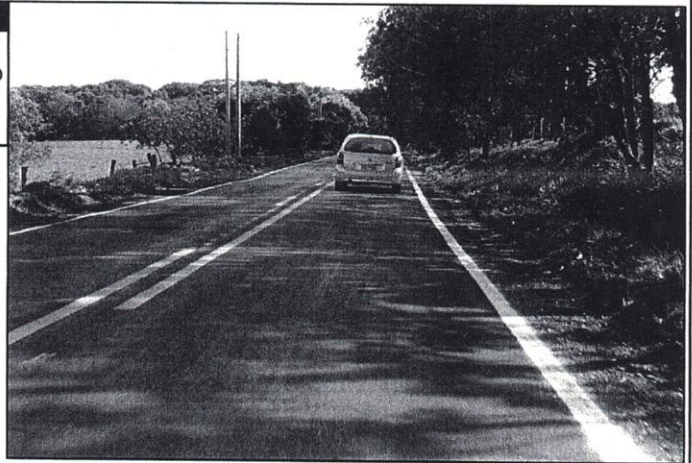


L21_15010406_2017-11-07_Foto (14)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 4+500 ao km 7+406 em execução.

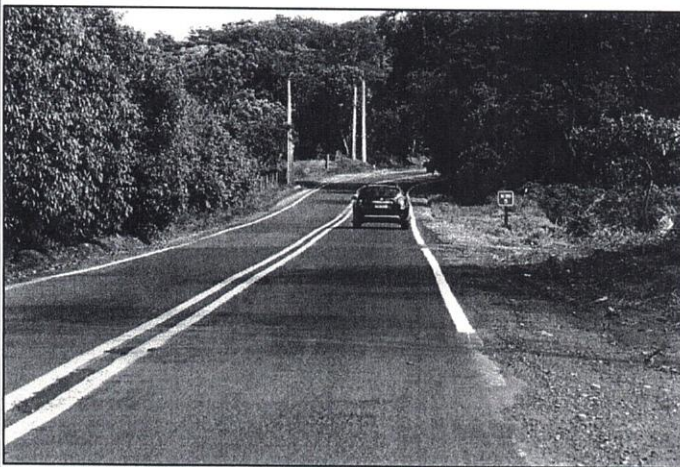

L21_15010406_2017-11-07_Foto (15)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 4+500 ao km 7+406 em execução.

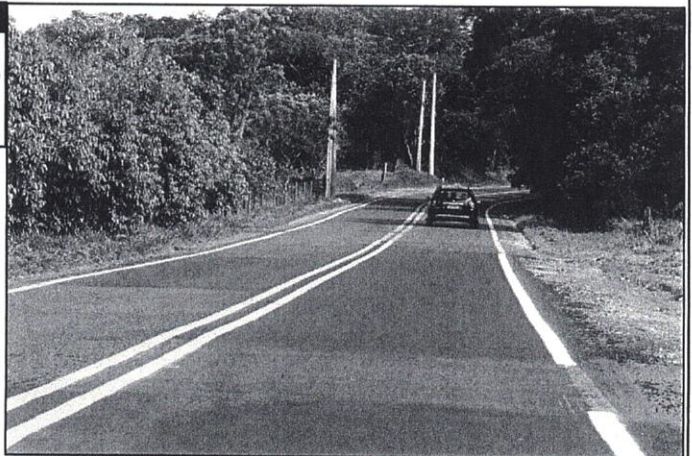

CÓPIA

PROTOCOLADO

369952

Folhas

Nome/Rubrica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Obra: 15.01.04.06 - Recapeamento - Vicinal BTC 353 - Botucatu (Extensão 7,406 km)

Novembro/2017

07/11/2017


L21_15010406_2017-11-07_Foto (16)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 4+500 ao km 7+406 em execução.

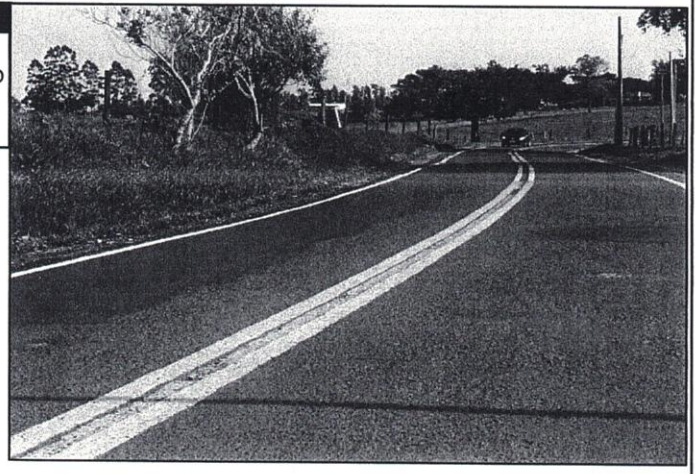


L21_15010406_2017-11-07_Foto (17)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 4+500 ao km 7+406 em execução.

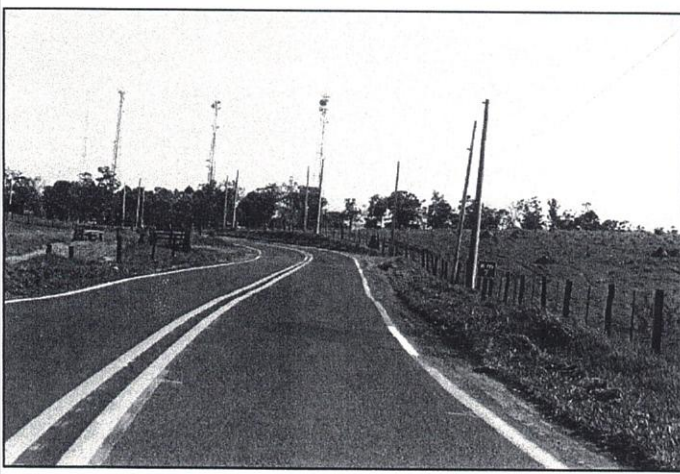

L21_15010406_2017-11-07_Foto (18)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul entre o km 4+500 ao km 7+406 em execução.

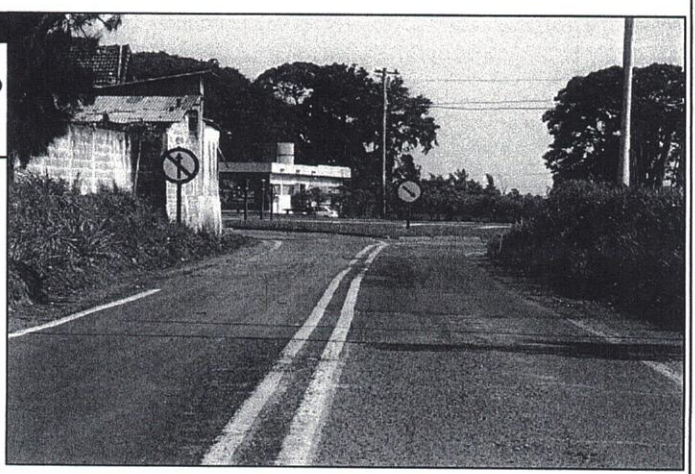

CÓPIA

PROTOCOLADO

369952

Folhas
36

Nome/Rubrica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: 15.01.04.06 - Recapeamento - Vicinal BTC 353 - Botucatu (Extensão 7,406 km)

Dezembro/2017

05/12/2017


L21_15010406_2017-10-17_Foto (1)

Placa Institucional da obra.




L21_15010406_2017-11-16_Foto (2)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul, km 7+400, concluído.

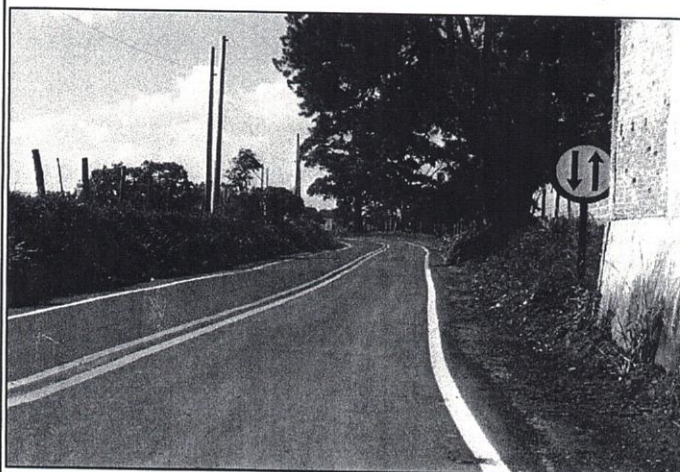

L21_15010406_2017-11-16_Foto (3)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul, km 7+300, concluído.

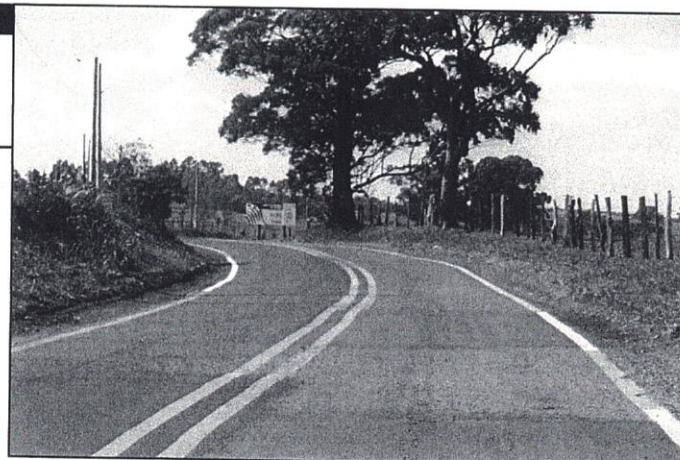

CÓPIA

PROTOCOLADO

369952

Folhas

Nome/Rubrica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: 15.01.04.06 - Recapeamento - Vicinal BTC 353 - Botucatu (Extensão 7,406 km)

Dezembro/2017

05/12/2017


L21_15010406_2017-11-16_Foto (4)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul, km 6+200, concluído.




L21_15010406_2017-11-16_Foto (5)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul, km 6+200, concluído.

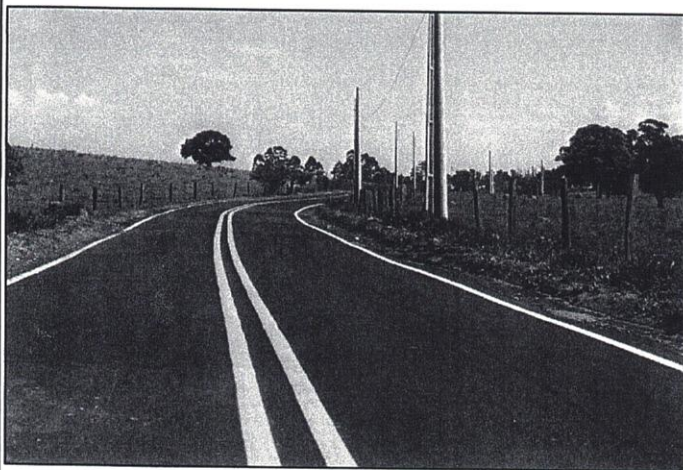

L21_15010406_2017-11-16_Foto (6)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul, km 6+300, concluído.

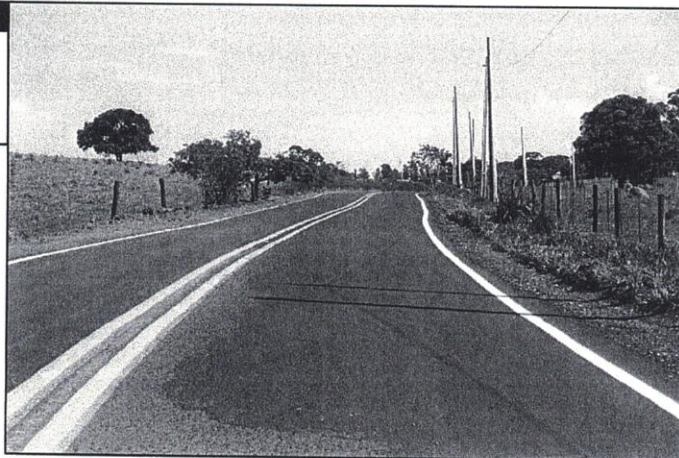

CÓPIA

PROTOCOLADO

363952

Folhas

Nome/Rubrica

38

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Obra: 15.01.04.06 - Recapeamento - Vicinal BTC 353 - Botucatu (Extensão 7,406 km)

Dezembro/2017

05/12/2017


L21_15010406_2017-11-16_Foto (7)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul, km 6+500, concluído.

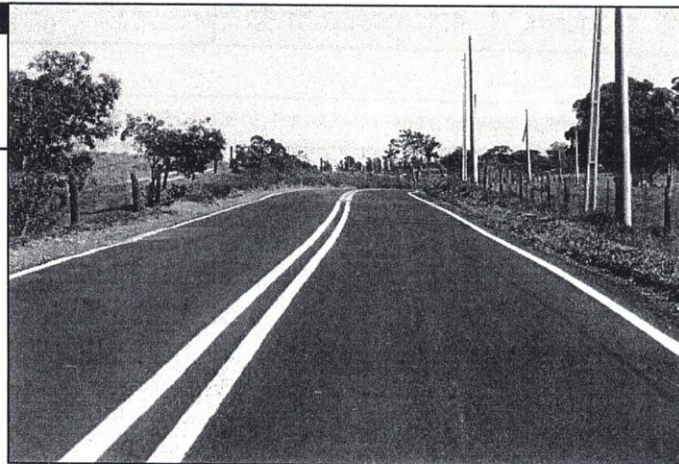


L21_15010406_2017-11-16_Foto (8)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul, km 6+700, concluído.

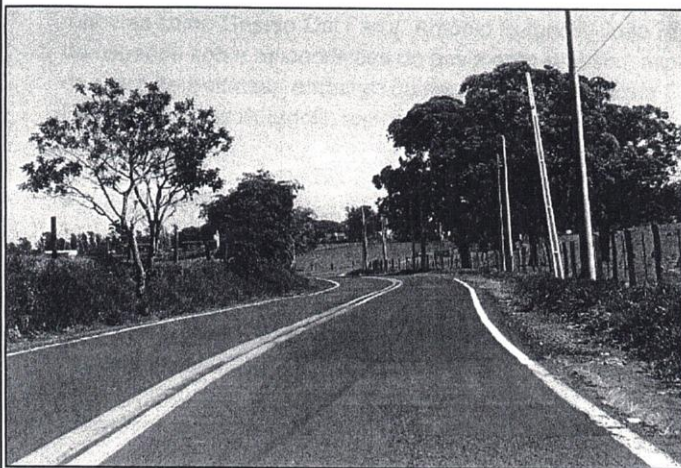

L21_15010406_2017-11-16_Foto (9)

Reparos superficiais (localizados) na pista Norte e Sul, km 7+000, concluído.

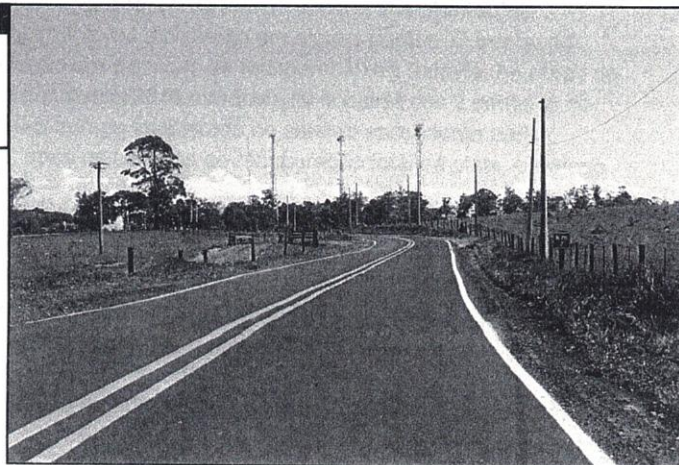

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.91825/17	11/12/2017	0

Folhas	Nome/Rubrica
40	

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
369952		0	OF. Nº 1139/2017/GP	11/12/2017

INTERESSADO : CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

ASSUNTO : MOÇÃO Nº 164/2017, DE REPÚDIO À CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ, EM RAZÃO DOS PÉSSIMOS SERVIÇOS PRESTADOS.

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - FLAVIO DA COSTA ALVES ROSSI

PARA : DIN - INVESTIMENTOS - RENATO CIRILLO JUNIOR

5) Referente as condições do pavimento das Vicinais em Botucatu, informamos que existe um programa de recapeamento de vicinais que está sendo executado pela Concessionária. Em especial podemos apontar os serviços de recuperação do pavimento que se encontram em execução na BTC-353/300 de Botucatu até a divisa com o município de Pardinho. Estão sendo executados preliminarmente os serviços de fresagem e recomposição do pavimento e reparos profundos localizados, e na sequencia será executado o recapeamento de toda vicinal. (Vide relatório fotográfico às fls. 30 a 38).

E, finalmente, informamos que a Concessionária é devidamente notificada de todas os defeitos e patologias de pavimento constatados pela fiscalização da Artesp, ao longo de toda malha concedida. A Concessionária está executando os reparos através dos recursos da conservação de rotina. Cabe informar que a partir de 2.018 estão previstos os serviços de conservação especial de pavimento com o recapeamento de todas as rodovias sob concessão da Rodovias do Tietê.



Flávio da Costa Alves Rossi
Membro da Diretoria de Investimentos

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.92239/17	13/12/2017	0

PROTOCOLADO 369952	
Folhas 46	Nome/Rubrica RL

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
369952		0	OF. Nº 1139/2017/GP	13/12/2017

INTERESSADO : CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

ASSUNTO : MOÇÃO Nº 164/2017, DE REPÚDIO À CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ, EM RAZÃO DOS PÉSSIMOS SERVIÇOS PRESTADOS ,

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - RENATO CIRILLO JUNIOR

PARA : DIN - INVESTIMENTOS - SERGIO PAUPERIO SERIO

Engº Sergio P. Serio

Segue FD.DIN.91825/17 conforme solicitado.

Engº Renato Cirillo Junior
DIN/Fiscalização

tsr/RCJ

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.92444/17	14/12/2017	0

PROTOCOLADO	
369952	
Folhas	Rubrica
42	100880

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
369952		0	OF. Nº 1139/2017/GP	14/12/2017

INTERESSADO : CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

ASSUNTO : MOÇÃO Nº 164/2017, DE REPÚDIO À CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ, EM RAZÃO DOS PÉSSIMOS SERVIÇOS PRESTADOS.

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - SERGIO PAUPERIO SERIO

PARA : DIN - INVESTIMENTOS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

À DIN
Dr. Pedro

Trata-se de Ofício nº 1139/2017/GP da Câmara Municipal de Botucatu, protocolado na ARTESP em 25/set/2017 sob o nº 369.952/17, encaminhando a Moção de repúdio à Concessionária Rodovias do Tietê nº 164/2017, referente aos serviços prestados às rodovias que circundam Botucatu.

A respeito cumpre-nos informar que o expediente foi analisado pela DIN/Fiscalização, conforme despachos FD.DIN.91825/17 e FD.DIN.92239/17 (fls. 39 à 41).

Se de acordo encaminhar à DGR/Maurity para prosseguimento.



Sergio Pauperio Serio
DIN / Assessoria

À DGR/Maurity

De acordo com a manifestação acima.
Encaminhamos para prosseguimento.



Pedro da Silva Brito Junior
Diretor de Investimentos

mcrp/SPS

ARTESP
Assessoria Parlamentar
Entrada
18 DEZ. 2017
Horário: 11:32
Visto: 
